



Ente Ospedaliero Cantonale

Stérilisation centrale au Tessin. Mise en place? Difficultés?

Antonio Di Iorio

Directeur Services Centrales de Biasca, EOC

eoc

Agenda

- Deux mots sur l'EOC
- Le plan de réalisation du projet Stérilisation Centrale

Deux mots sur l'EOC



L'EOC (Ente ospedaliero cantonale) a été constitué en 1983 pour réunir tous les hôpitaux d'intérêt public dans une seule organisation

Deux mots sur l'EOC

**Blanchisserie
et
Stérilisation
(Services Centrales Biasca)**



La Blanchisserie centrale a été réalisée en 1991, la Stérilisation en 2008.

Deux mots sur l'EOC

- 8 sites hospitalier + 3 sites de service
- 3'600 employés
- 1'000 lits
- 35'000 patients stationnaires par année
- 210'000 patients ambulatoires
- 450 Mio/fr. de budget par année

L'EOC est une entreprise cantonale ayant personnalité juridique autonome de droit public.

Deux mots sur l'EOC


- 7 hôpitaux et 1 clinique de réadaptation
- 5 blocs opératoires / 7 stérilisations

avec:

- 23 salles OP
- 5 sales d'endoscopie
- 11 salles d'accouchements
- plusieurs services qui produisent:

90'000 UTS par année

Le plan de réalisation

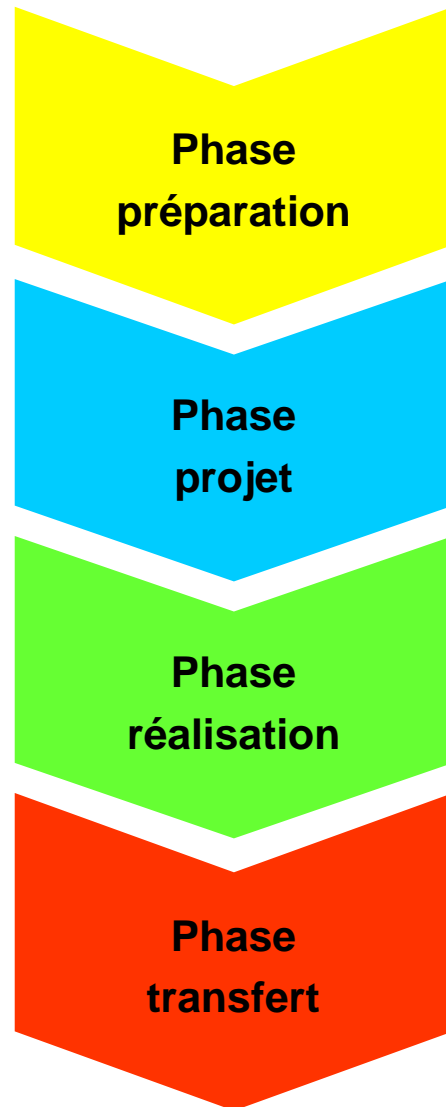

Définition du projet
Composition groups de travaux
Recherche des ressource pour projet

novembre 2006

Définition processus opératifs
Dimensionnement Projet détaillé
Budget détaillé

printemps 2007


Choix et achat équipements
Bâtiment
Choix et formation des collaborateurs

septembre 2008


Transfert successif des hôpitaux
Certification

octobre 2008 - février 2011

Le plan de réalisation



Le plan de réalisation



Le plan de réalisation


Hôpital	Activités	Répondable	mar.09	apr.09	mag.09	giu.09	lug.09	ago.09	set.09	ott.09	nov.09	dic.09
ORBV	Correction des check list en iSteriC	SCB										
	Consolidation des services	SCB	-----	-----	-----							
	Composition des nouveau plateaux	SCB										
	Période de consolidations des activités	SCB/ORBV			-----	-----						
ODL	Correction des check list en iSteriC	SCB										
	Consolidation des services	SCB				-----	-----	-----				
	Composition des nouveau plateaux	SCB										
	Transfer des activités à SCB	SCB/ODL				◆						
	Période de consolidations des activités	SCB/ODL				-----	-----					
OBV	Achat des nouveaux instruments	SCB/ EOSCA										
	Consolidation des services	SCB						-----	-----	-----		
	Composition des nouveau plateaux	SCB										
	Correction des check list en iSteriC	SCB										
	Transfer des activités à SCB	SCB/OBV							◆			
	Période de consolidations des activités	SCB/OBV							-----	-----	-----	
ORL	Achat des nouveaux instruments	SCB/ EOSCA										
	Consolidation des services	SCB								-----	-----	-----
	Composition des nouveau plateaux	SCB										
	Correction des check list en iSteriC	SCB										
	Transfer des activités à SCB	SCB/ORL									◆	
	Période de consolidations des activités	SCB/ORL									-----	-----
SCB	fase 2 Software iSteriC	SCB										
SCB	Test alternative di trasporto	SCB										
SCB	Lavori per certificazione	SCB										
SCB	Certificazione ISO	SCB/ EOQUAL					◆					

Le plan de réalisation



**Phase
transfert**



Le plan de réalisation



Le plan de réalisation





Ente Ospedaliero Cantonale

Stérilisation centrale au Tessin. Mise en place? Difficultés?

Rosa Da Veiga

Responsable Stérilisation Centrale de
Biasca, EOC

eoc

Agenda

- Difficultés
- Le nouveau plan de réalisation du projet Stérilisation Centrale

Description de la situation

- Lieu pilot Bellinzona depuis deux mois avec une partie des plateaux stérilisés localement
- Climat conflictuel entre le bloc de Bellinzona et la centrale de Biasca
- Commande de plateaux plus haut du prévu
- Plateaux commandés pas encore prêt
- Personnel de la stérilisation pas encore complètement formés


Actions

- Création d'un group de travail ad hoc avec les représentants des hôpitaux
- Révision du plan de transfèrement des activités à Biasca
- Formation du personnel tenue par les infirmières instrumentistes avec stages au blocs
- Révision des listes des plateaux
- Achat des plateaux supplémentaires

Le nouveau plan de réalisation


	03.5.10	10.5.10	17.5.10	06.7.10	12.7.10	06.9.10	13.9.10	20.9.10	27.9.10	04.10.10	11.10.10	18.10.10	25.10.10	01.11.10	08.11.10	15.11.10	22.11.10	29.11.10	06.12.10	13.12.10	20.12.10	27.12.10	03.1.11	10.1.11	17.1.11	
settimana n°	18	19	20	27	28	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	2	
Trasferimento attività steri x reparti																										
tutti i reparti di OIL																										
OCL: sala parto, cura (torre 2°-14° piano), emodialisi																										
OCL: ORL, PS, Ambulatori, CI, Ergoterapia, Radioterapia																										
Messa fuori servizio autoclavi -2 OCL																										
OCL: Endoscopia																										
Trasferimento attività steri x BOP																										
OIL: oftalmologia																										
OIL: resto delle specialità																										
periodo di consolidamento																										
smantellamento sterilizzazione BOP OIL																										
OCL: ginecologia																										
OCL: ORL																										
OCL: chirurgia generale + urologia																										
OCL: ortopedia + traumatologia																										
OCL: neurochirurgia																										
periodo di consolidamento																										
smantellamento sterilizzazione BOP OCL																										
formazione personale SCB x Neurochir																										
inserimento e consolidamento dati liste OIL																										
inserimento e consolidamento dati liste OCL																										
Punti di controllo avanzamento attività																										

Le plan de réalisation



Le plan de réalisation

**Phase
transfert**

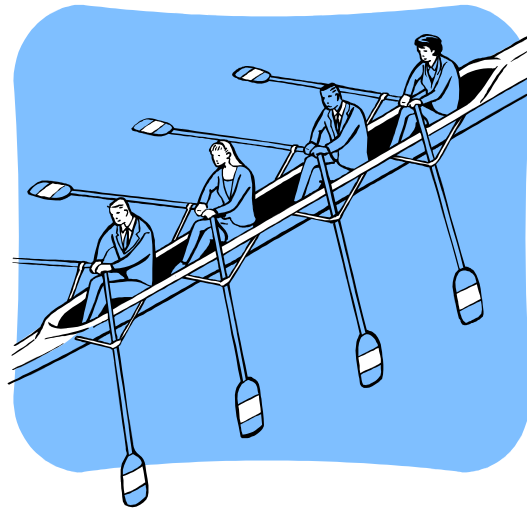



MERCI
